G&G Builders, Inc.
Powered By RedTeam Software

SCHEDULE

Project: 1020113 - Fair Oaks Park

Date: 10/24/2019
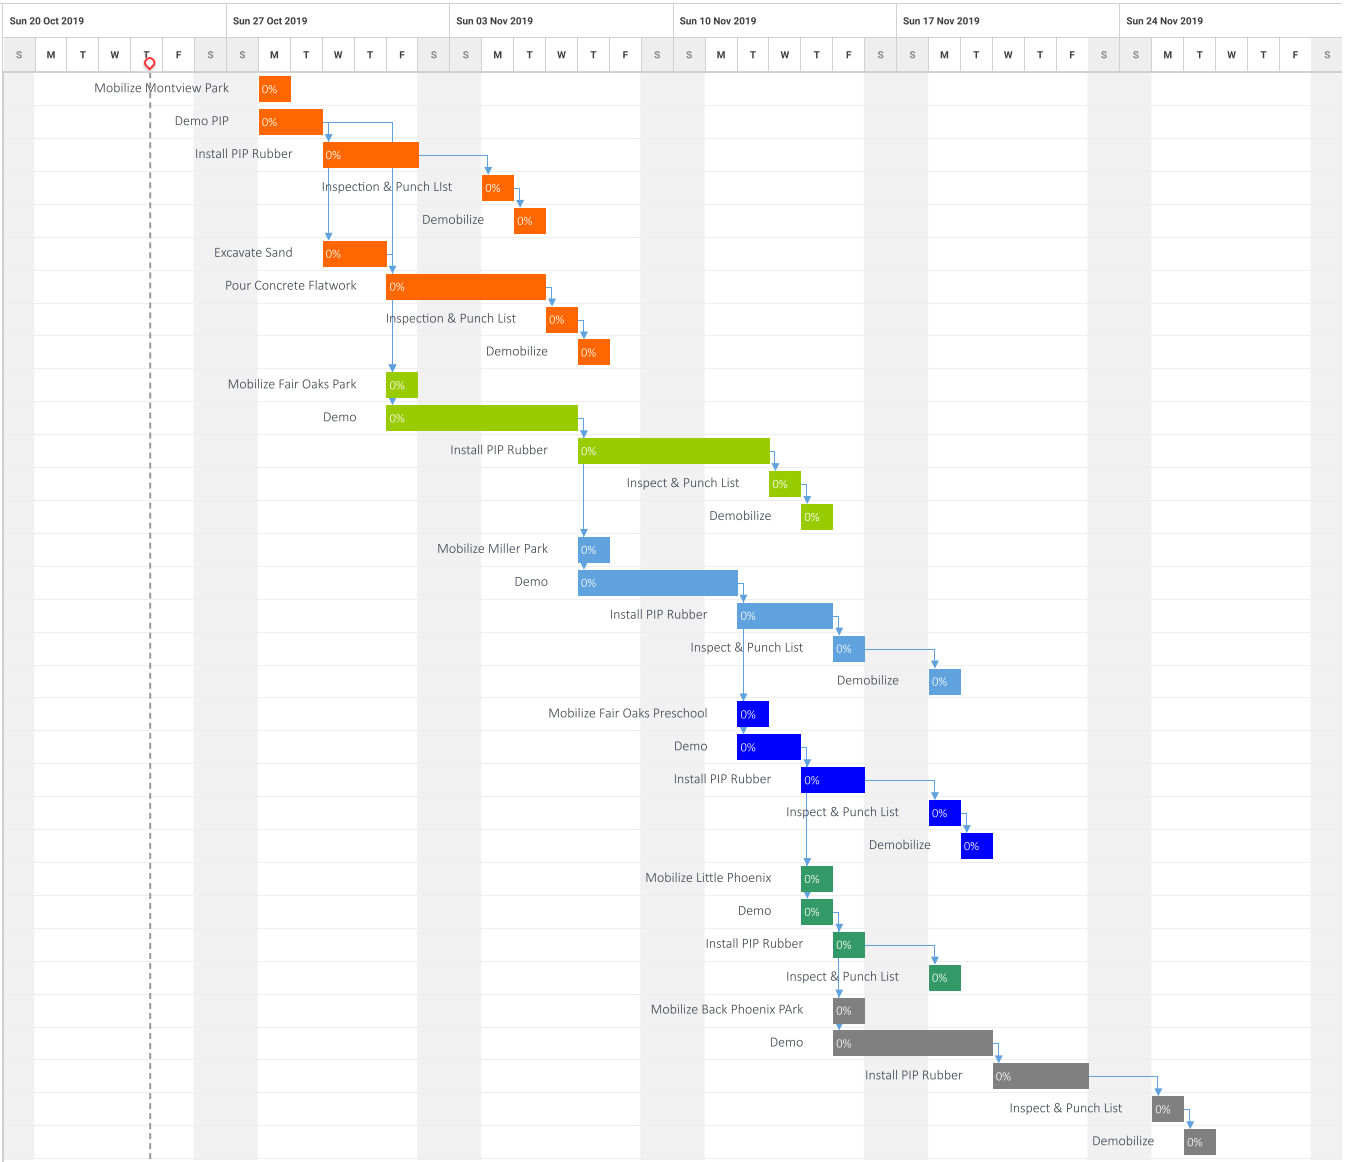
Task Name	Duration	Start	Finish
Mobilize Montview Park	1 day	10/28/2019	10/28/2019
Demo PIP	2 days	10/28/2019	10/29/2019
Install PIP Rubber	3 days	10/30/2019	11/01/2019
Inspection & Punch LIst	1 day	11/04/2019	11/04/2019
Demobilize	1 day	11/05/2019	11/05/2019
Excavate Sand	2 days	10/30/2019	10/31/2019
Pour Concrete Flatwork	3 days	11/01/2019	11/05/2019
Inspection & Punch List	1 day	11/06/2019	11/06/2019
Demobilize	1 day	11/07/2019	11/07/2019
Mobilize Fair Oaks Park	1 day	11/01/2019	11/01/2019
Demo	4 days	11/01/2019	11/06/2019
Install PIP Rubber	4 days	11/07/2019	11/12/2019
Inspect & Punch List	1 day	11/13/2019	11/13/2019
Demobilize	1 day	11/14/2019	11/14/2019
Mobilize Miller Park	1 day	11/07/2019	11/07/2019
Demo	3 days	11/07/2019	11/11/2019
Install PIP Rubber	3 days	11/12/2019	11/14/2019
Inspect & Punch List	1 day	11/15/2019	11/15/2019
Demobilize	1 day	11/18/2019	11/18/2019
Mobilize Fair Oaks Pres...	1 day	11/12/2019	11/12/2019
Demo	2 days	11/12/2019	11/13/2019
Install PIP Rubber	2 days	11/14/2019	11/15/2019
Inspect & Punch List	1 day	11/18/2019	11/18/2019
Demobilize	1 day	11/19/2019	11/19/2019
Mobilize Little Phoenix	1 day	11/14/2019	11/14/2019
Demo	1 day	11/14/2019	11/14/2019
Install PIP Rubber	1 day	11/15/2019	11/15/2019
Inspect & Punch List	1 day	11/18/2019	11/18/2019
Mobilize Back Phoenix ...	1 day	11/15/2019	11/15/2019
Demo	3 days	11/15/2019	11/19/2019
Install PIP Rubber	3 days	11/20/2019	11/22/2019
Inspect & Punch List	1 day	11/25/2019	11/25/2019
Demobilize	1 day	11/26/2019	11/26/2019
